


AEROPORTOS



RESULTADOS DO 10º BALANÇO


AEROPORTOS

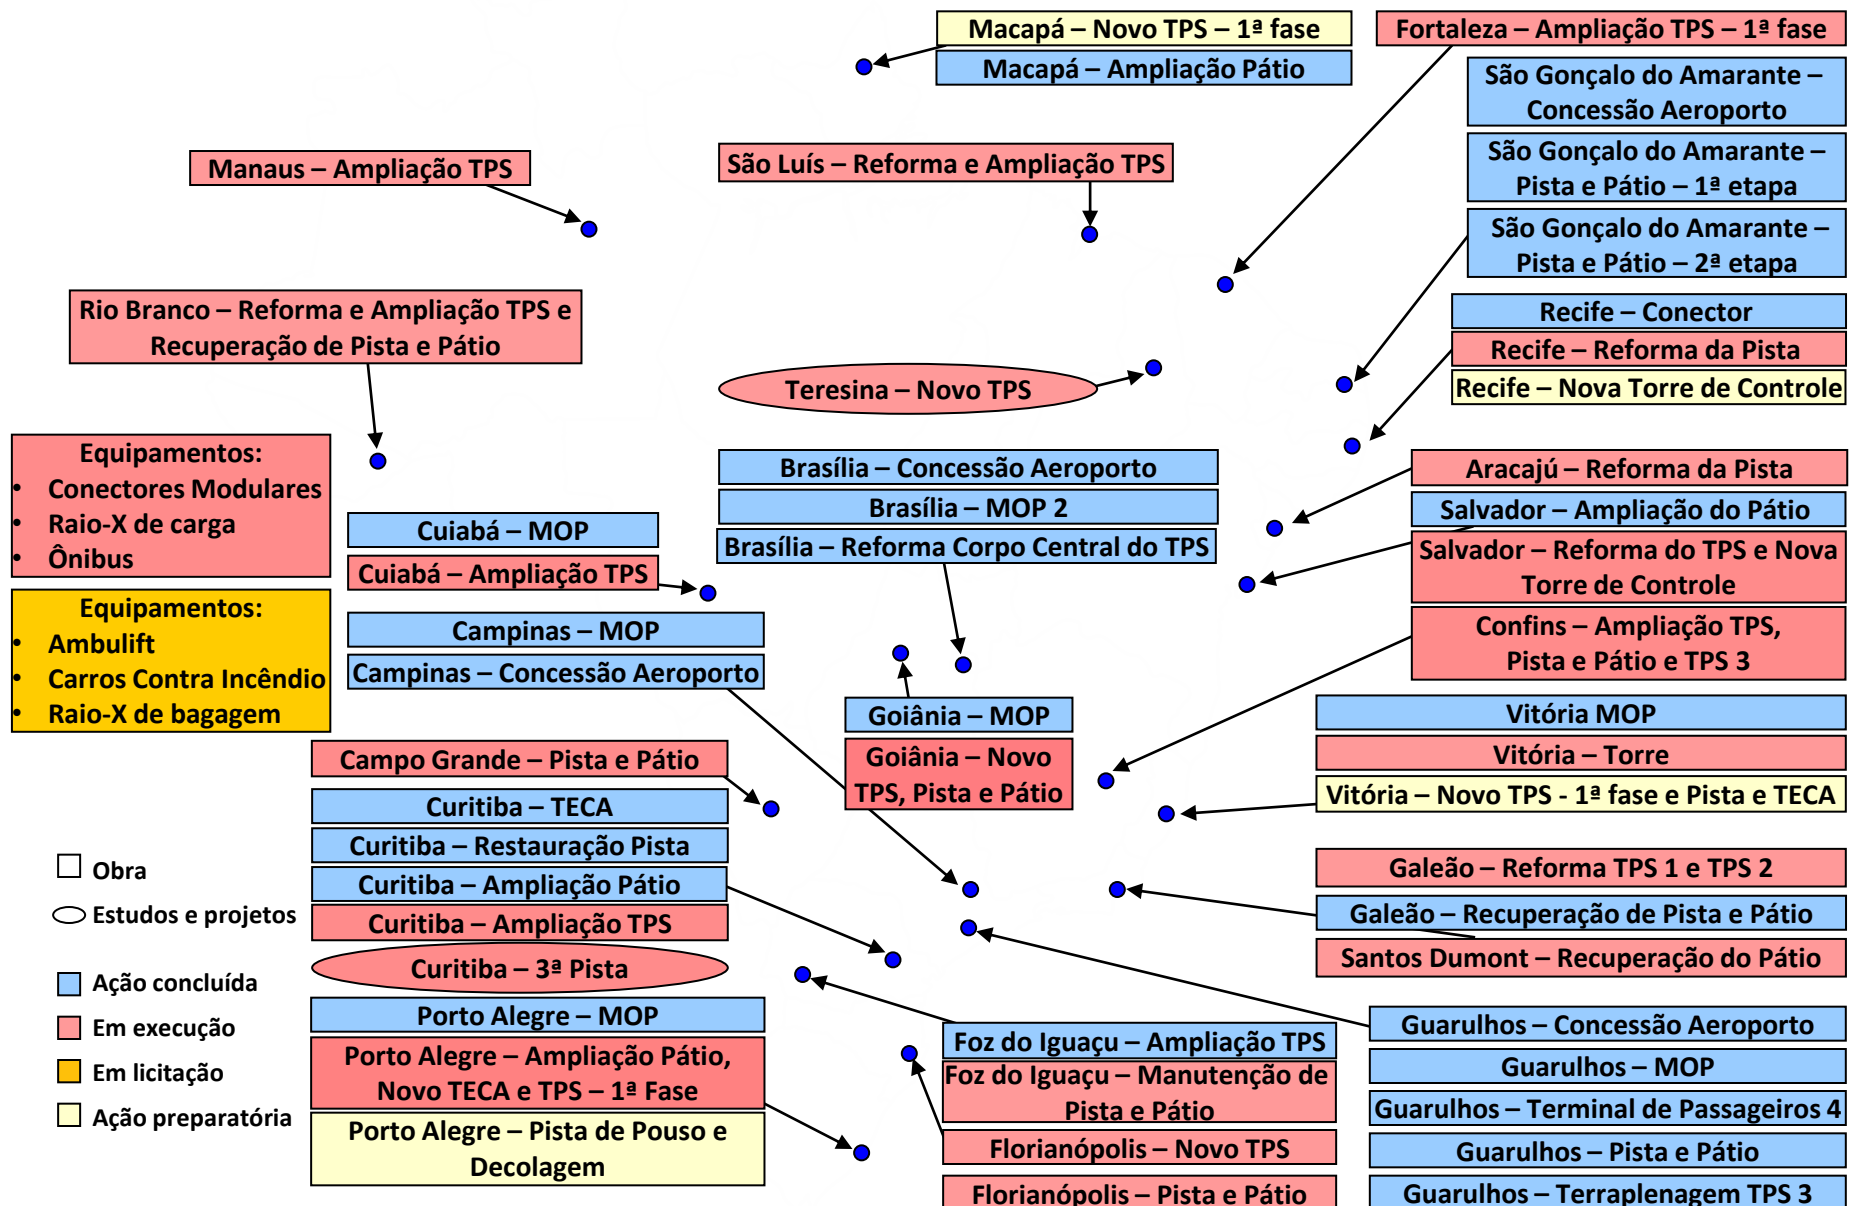

AVIAÇÃO REGIONAL

Região	Nº de aeródromos
Norte	67
Nordeste	64
Centro-Oeste	31
Sudeste	65
Sul	43
Total	270

186 caminhões contra incêndio – 35 entregas até Junho de 2014

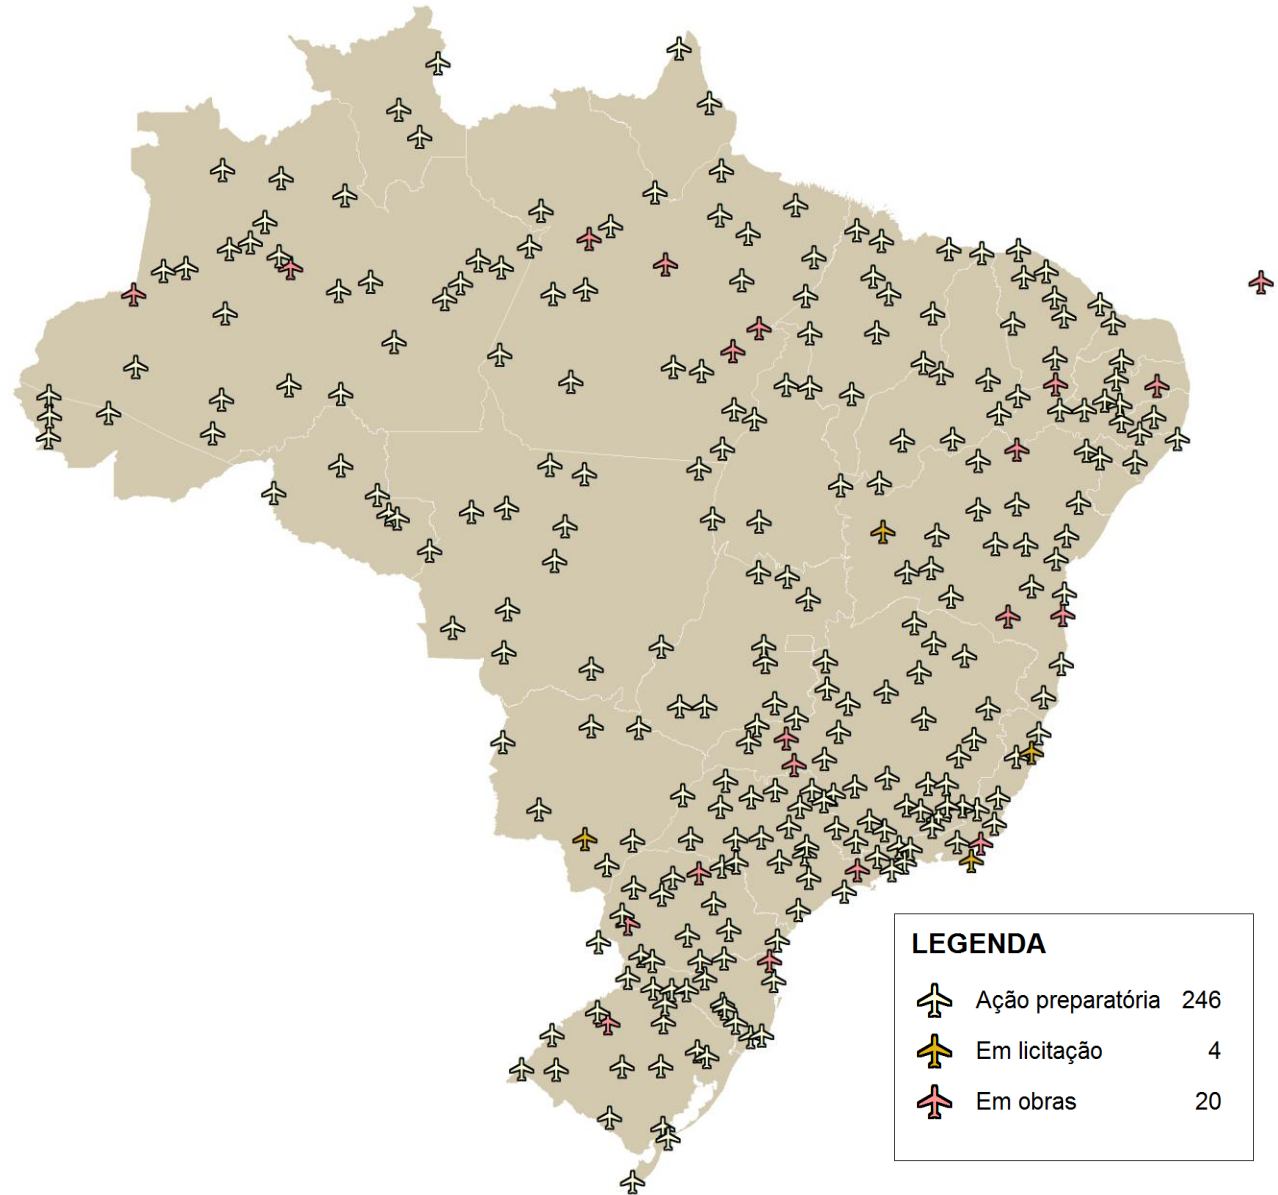

AEROPORTOS

Principais Resultados

Obras entregues para a Copa do Mundo 2014

- **Belo Horizonte/MG – Reforma e Ampliação da Sala de embarque, desembarque e saguão de embarque do TPS, Implantação do TPS 3 e 31 novas posições de estacionamento nos Sistemas de Pátio de Aeronaves.**
- **Brasília – Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros e Pátio de Aeronaves**
- **Cuiabá/MT – Ampliação da área de desembarque e check-in, novas esteiras de bagagem, novo estacionamento, sala de embarque no piso superior, 2 pontes de embarque, novos elevadores, escadas rolantes e Módulo Operacional.**
- **Curitiba/PR – Nova Sala de Desembarque, reforma do Terminal de Passageiros existente e ampliação do conector com 2 novas pontes de embarque, Pátio de Aeronaves e Restauração das pistas de pouso e decolagem.**
- **Fortaleza/CE – Ampliação do Pátio de Aeronaves, ampliação da sala de embarque, Terminal Remoto Temporário e reforma de 3 pontes de embarque.**
- **Galeão/RJ – Reformas no TPS 1 - modernização do Setor A - e TPS 2 - Área de desembarque, 4 novas esteiras de bagagem e novos sistemas e Recuperação e Alaargamento dos Sistemas de Pistas e Pátios.**
- **Guarulhos/SP – Construção do Terminal de Passageiros 3 e 4, Módulo Operacional, Reforma da Pista de Pouso e Decolagem e Ampliação do Pátio.**
- **Manaus/AM – Reforma e Ampliação do TPS - Saguão, salas de embarque e desembarque, estacionamento, novos balcões de check-in, 2 pontes de embarque e 2º piso operacional.**
- **Porto Alegre/RS – Reforma Ampliação da Área de Desembarque do TPS 1, Módulo Operacional, novas pontes de embarque no TPS 2 e 1 nova posição de estacionamento no Pátio de Aeronaves.**
- **Salvador/BA – Reforma do TPS - nova área de embarque doméstico remoto, substituição de esteiras de bagagem, reforma do check-in, reforma e instalação de novos elevadores e escadas rolantes, reforma de conjuntos de banheiros e Pátio de Aeronaves.**
- **São Gonçalo do Amarante/RN – Novo Terminal de Passageiros e Construção do Sistema de Pistas e Pátios**
- **Viracopos/SP – Novo Terminal Internacional de Passageiros, Módulo Operacional e Novo Pátio de Aeronaves**

AEROPORTOS

Principais Resultados

Outras obras concluídas – Destaques

- **Aviação Regional – 11 ações concluídas em 8 cidades – incluindo: Campina Grande/PB – Recuperação da Pista de Pouso e Decolagem – 31/05/2014**
- **Foz do Iguaçu/PR – Reforma e Ampliação do TPS – 30/11/2013**
- **Macapá/AP – Pátio de Aeronaves – 25/07/2013**
- **Curitiba/PR – Ampliação do Terminal de Cargas – 23/01/2013**
- **2 Módulos Operacionais – Goiânia/GO e Vitória/ES entre 02/09/2011 e 15/10/2011**
- **Recife/PE – Conector – 20/06/2011**


Obras iniciadas

- **Aviação Regional - Vitória da Conquista/BA - Novo Aeroporto – 02/06/2014**


AEROPORTOS

Ações Significativas


Guarulhos/SP – Terminal de Passageiros 4



Concessão de aeroportos – Fase 1




Módulos operacionais em 7 aeroportos



Galeão/RJ – Sistemas de Pistas e Pátio




Confins/MG – Reforma e modernização do TPS



Manaus/AM – Terminal de Passageiros



Porto Alegre/RS – Terminal de Cargas



GALEÃO – RIO DE JANEIRO/RJ

Sistemas de Pistas e Pátio



Recuperação e revitalização dos Sistemas
de Pistas e Pátio

DESCRIÇÃO: Alargamento do Sistema de Pistas e recuperação da pavimentação dos Sistemas de Pistas e Pátio, permitindo a operação de aeronaves F-A380

UF: RJ

META: 4.000 m²

DATA DE CONCLUSÃO: 16/03/2014

INVESTIMENTO REALIZADO 2007-2010: R\$ 54 milhões

INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: R\$ 85,1 milhões

EXECUTOR: INFRAERO

RESULTADO

➤ Obra concluída em 16/03/2014



CONFINs – BELO HORIZONTE/MG

Reforma e Modernização do TPS



Reforma e modernização do TPS

DESCRIÇÃO: Reforma, modernização e ampliação do Terminal de Passageiros, com substituição das pontes de embarque existentes, atualização tecnológica dos sistemas eletroeletrônicos e eletromecânicos, ampliação da área de todos os processadores – *check-in*, embarque e desembarque, adequação do sistema viário de acesso e incremento das áreas comerciais. Aumento da capacidade anual em 1,5 milhão de passageiros

UF: MG

META: 7.370 m²

INVESTIMENTO REALIZADO 2007-2010: R\$ 3 milhões

INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: R\$ 260,04 milhões

EXECUTOR: INFRAERO

DATA DE CONCLUSÃO: Escopo Copa: 31/05/2014

Demais intervenções: 20/12/2014

RESULTADO

➤ Ampliação e reforma de 50% do saguão de embarque, 9 pontes de embarque, ampliação da sala de desembarque internacional, novo terraço, 80% da cobertura da via de acesso – 31/05/2014

➤ Obra com 47% realizados

PROVIDÊNCIA

➤ Concluir a obra até 20/12/2014



MANAUS/AM

Terminal de Passageiros



Reforma e ampliação do TPS

DESCRIÇÃO: Reforma, modernização e ampliação do Terminal de Passageiros, edificações complementares e estacionamento, atualização tecnológica dos sistemas eletroeletrônicos e eletromecânicos, instalação de mais duas pontes de embarque, ampliação da área de todos os processadores – *check-in*, embarque e desembarque, adequação do sistema viário de acesso e incremento das áreas comerciais. Aumento da capacidade anual em 7,1 milhões de passageiros

UF: AM

META: 57.775 m²

INVESTIMENTO REALIZADO 2007-2010: R\$ 610 mil

INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: R\$ 444,5 milhões

EXECUTOR: INFRAERO

DATA DE CONCLUSÃO: Escopo Copa: 10/06/2014

Demais Intervenções: 30/09/2014

RESULTADO

- Entrada em operação do saguão de embarque, novas salas de embarque e desembarque e estacionamento em 15/01/2014
- 38 balcões de check-in, saguão público de desembarque, 1200 vagas de estacionamento, 2 pontes de embarque, implantação do 2º piso operacional e 2 novas esteiras de bagagem – 10/06/2014
- Obra com 89% realizados

PROVIDÊNCIA

- Concluir a obra até 30/09/2014



PORTO ALEGRE/RS

Terminal de Cargas



Construção do novo Terminal de Cargas

DESCRIÇÃO: Construção de novo complexo de logística de cargas, com pátio de aeronaves, edifício de administração e órgãos públicos, estacionamentos de caminhões e veículos

UF: RS

META: 29.682 m²

DATA DE CONCLUSÃO: 09/09/2015

INVESTIMENTO REALIZADO 2007-2010: R\$ 6,2 milhões

INVESTIMENTO PREVISTO 2011-2014: R\$ 137,2 milhões

EXECUTOR: INFRAERO

RESULTADOS

- Concluída a revisão dos projetos de infraestrutura, telemática e elétrica em 20/09/2013
- Obra de infraestrutura contratada em 02/04/2014 e iniciada em 09/06/2014.
- Obra com 27% realizados

RESTRICÇÃO

- Obra de edificações paralisada por problemas com solução de geotecnia para fundação

PROVIDÊNCIAS

- Publicar edital de licitação para retomada das obras de edificações até 30/08/2014

